

Выбор подхода · Scrum / Kanban

МЫ ВЫБИРАЕМ KANBAN

Проект с внешним НКО и уточняющимися требованиями: нам нужен поток задач, а не фиксированный спринт

1

Требования НЦФГ ещё уточняются

После каждой встречи с НКО появляются новые вводные — сразу поднимаем их в приоритете, **не дожидаясь конца спринта**

2

Ответы НКО приходят не мгновенно

Задача, ждущая ответа НЦФГ, уходит в **Blocked**, а команда берёт следующую — работа не встаёт, план не срывается

3

Исследование, дизайн и разработка — в разном темпе


Интервью с семьями, прототипы и backend трудно уложить в один спринт — доска показывает, где застряло

4

Небольшой команде нужен лёгкий процесс


Вместо жёстких спринтов — визуальный поток, **WIP-лимит** и три коротких синка: этого достаточно, чтобы держать работу прозрачной

НАША KANBAN-ДОСКА

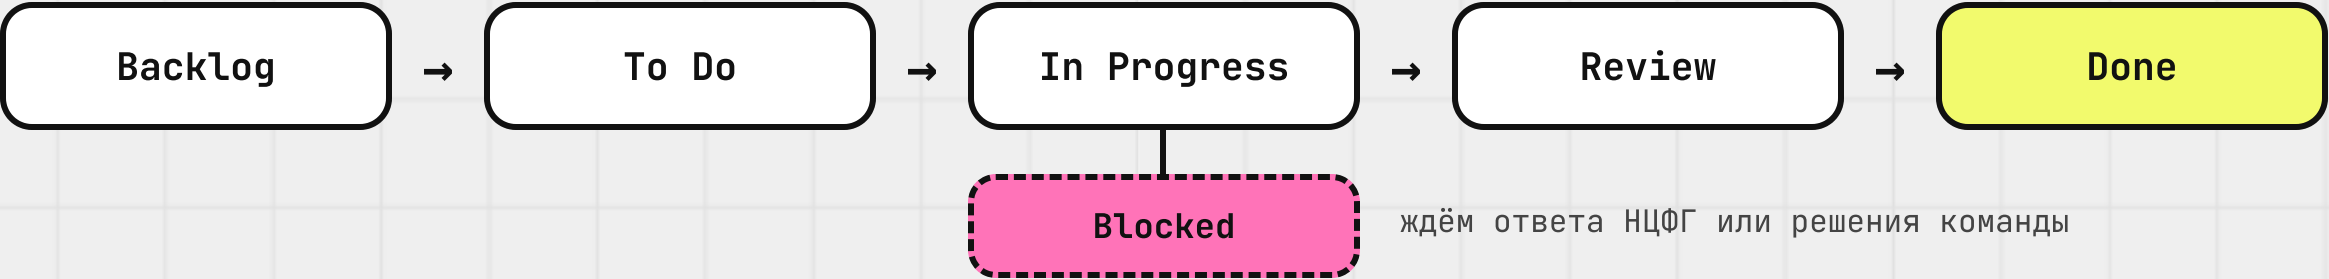

WIP ≤ 2

не больше 2 задач In Progress на одного участника



Kick-off команды

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Роли и зоны ответственности · ритм работы на 3 недели по Kanban

РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТЕПАН

Product Lead · Fullstack · UI/UX

Основной контакт с НЦФГ · приоритеты и backlog · пользовательские сценарии · UI/UX и прототипы · frontend · интеграция frontend с API

АРСЛАН

Kanban Flow · Project Manager

Kanban-доска и WIP-лимит · ведёт все встречи · следит за Blocked и сроками · фиксирует решения команды

БОРИС

Backend Lead

Backend-архитектура · API · база данных · бизнес-логика · интеграции · отвечает за весь backend

СОФИЯ

UX Research · Analyst

Интервью и опросы · сбор обратной связи · проверка гипотез · анализ результатов и выводы для команды

КИРИЛЛ

QA · Testing Lead

Тест-сценарии · проверка задач в колонке Review · баг-репорты · критерии готовности (Definition of Done)

ГРАНИЦЫ ЗОН

Приоритеты — Степан · поток и встречи — Арслан
Backend и API — Борис · frontend и интеграция с API — Степан
Гипотезы — София · качество сделанного — Кирилл
Контакт с НЦФГ — Степан · София — на интервью и исследованиях

КАЛЕНДАРЬ · 3 НЕДЕЛИ

	ПН	СР	ПТ
НЕДЕЛЯ 1	Planning	Sync	Review+Retro
НЕДЕЛЯ 2	Planning	Sync	Review+Retro
НЕДЕЛЯ 3	Planning	Sync	Review+Retro

ПН

Weekly Planning / Replenishment

15-20 мин · вся команда · созвон у доски · ведёт Арслан
Степан задаёт приоритеты, пополняем To Do и проверяем WIP

СР

Short Sync

10-15 мин · вся команда · короткий созвон или чат · ведёт Арслан
Что движется, что в Blocked, кому нужна помощь

ПТ

Review + Retro

20-30 мин · вся команда · созвон · ведёт Арслан, Кирилл — итоги проверки
Показываем Done, улучшаем процесс, собираем вопросы к НЦФГ

НКО

Связь с НЦФГ — по необходимости

Основной контакт — Степан · София подключается к интервью и исследованиям
Telegram-чат с НЦФГ или созвон — когда есть вопросы или результат

